



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 14714 /11-11-2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/10-11-2020 συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων.

Αριθμ. Απόφασης 251/2020

Περίληψη: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [κεκλεισμένων των θυρών, δια ζώσης σύμφωνα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β' 1988) και αριθ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών], μετά από την αριθ. πρωτ. 14048/2-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη, βρέθηκαν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Εσκιογλου Ιορδάνης
2. Χατζηπλή Σοφία
3. Γούσιας Δημήτριος
4. Αρσενοπούλου Βαία
5. Χαμορούσου Ευαγγελία
6. Καραχάλιος Αριστομένης
7. Κατσιαούνης Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.


Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων, μας διαβίβασε προς έγκριση την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση "Βλαχόστρατα" του Δήμου Φαρσάλων». Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής :

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- i. Με την με αρ. 60553/31-10-2018 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάχθηκε το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα» του Δήμου Φαρσάλων», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας: 'Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».
- ii. Με την με αριθμ. 205/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», καθώς και με την με αριθμ. 28/2018 Τεχνική μελέτη του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Πολυδάμαντα στη θέση Βλαχόστρατα» του Δήμου Φαρσάλων» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων.
- iii. Η Περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου με αριθμό πρωτοκόλλου 12236/29-11- 2018
- iv. Με την με αριθμ. 252/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
- v. Με τη με αριθμό 7/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων περί επιλογής προσωρινού μειοδότη, την τεχνική εταιρεία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.". "
- vi. Με τη με αριθμ. 66/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη την τεχνική εταιρεία "ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.". "
- vii. Με τη με αριθμ. πρωτ. 6269/58389/17-04-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 66/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- viii. Στις 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου του έργου.
- ix. Η προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών του έργου ορίσθηκε σε **τετρακόσιες πενήντα (450)** ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι **23-10-2020**.

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Η βελτίωση της λειτουργικότητας και η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού «Βλαχόστρατα», η όδευση της οποίας περιλαμβάνει το τμήμα μεταξύ των οικισμών Χαλκιάδων (διασταύρωση με παλαιά εθνική οδό Φαρσάλων – Λάρισας) και Δασολόφου.

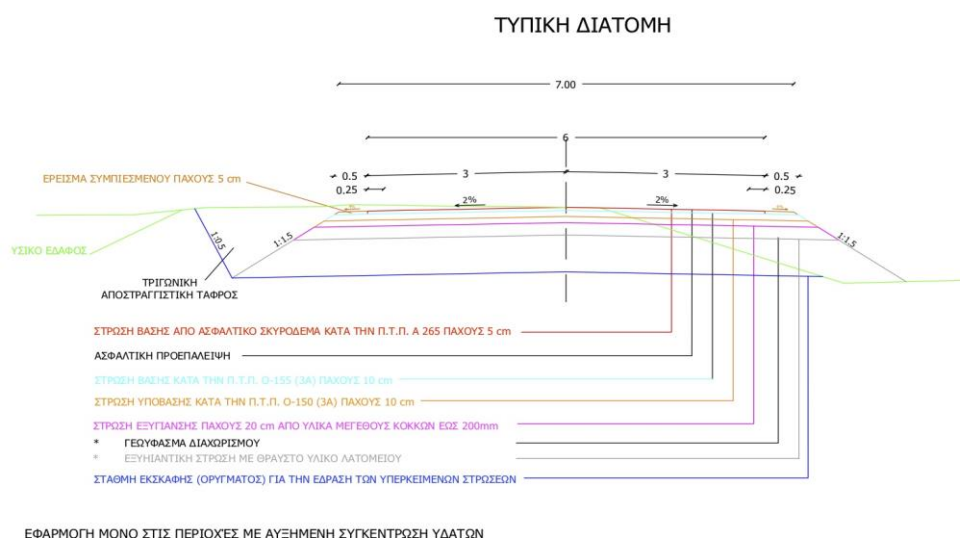

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΟ Α-2)
2. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΟ Α-12)
3. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος (ΟΔΟ Α-14)
4. Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΟΔΟ Α-19)
5. Κατασκευή επιχωμάτων (ΟΔΟ Α-20)

NT-1Π/1 . Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΥΔΡ 6067)

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΟ Β-1)
7. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών (ΟΔΟ Β-4.2)
8. Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. (ΟΔΟ Β-7)
9. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (ΟΔΟ Β- 29.1.1)
11. Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟ Β-29.4.2)
12. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΟ Β-30.2)
13. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01)

NT-1Π/2 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm

NT-1Π/3 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

NT-1Π/4 Γεώφασμα διαχωρισμού

ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία

17. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟ Γ-1.2)
18. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) (ΟΔΟ Γ-2.2)
19. Κατασκευή ερεισμάτων (ΟΔΟ Γ-5)

ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά

20. Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ-3)
21. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟ Δ-8.1)

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

22. Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m (ΟΔΟ Ε-9.1)
23. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΟ Ε-9.3)
24. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟ Ε-17.1)

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου Α.Π.Ε.

(i) ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την υπηρεσία σε ισοζύγιο με το ποσό του 1^{ου} ΑΠΕ χωρίς μεταβολή ποσοτήτων και χωρίς το κονδύλιο της αναθεώρησης το οποίο δεν θα αναλωθεί.

Οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε. Αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ορισμένες εργασίες, θα μπορούσαν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση ήταν απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. (Ν.4412/2006, άρθ. 156, παρ. 1 (γ)).

(ii) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Σύνολο Εργασιών	325.163,37 €	373.927,20 €	61.045,70 €	12.281,87 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	58.529,41 €	67.306,90 €	10.988,23 €	2.210,74 €
Άθροισμα εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%	383.692,78 €	441.234,10 €	72.033,93 €	14.492,61 €
Απρόβλεπτα	57.553,92 €	12,60 €		57.541,32 €
Σύνολο	441.246,69 €	441.246,70 €		
Αναθεώρηση	7.695,24 €	7.695,24 €		
Συνολική δαπάνη	448.941,93 €	448.941,94 €		
Φ.Π.Α. 24%	107.746,06 €	107.746,06 €		
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ	556.688,00 €	556.688,00 €		

		1η. Σ. Σ.	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Σύνολο Εργασιών		45.831,49 €		
ΓΕ & ΟΕ 18%		8.249,67 €		
Άθροισμα εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%		54.081,16 €		
Απρόβλεπτα		8.112,17 €		
Συνολική δαπάνη		62.193,33 €		
Φ.Π.Α. 24%		14.926,40 €		
Δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ		77.119,73 €		

(III) 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εντάσσονται επίσης μη προβλεπόμενες στην αρχική μελέτη του έργου αλλά απαιτούμενες και ανεγκάιες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, για την οποία και συντάσσονται οι νέες τιμές μονάδος στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, το οποίο συνοδεύει την παρούσα Αιτιολογική έκθεση.

Αναλυτικότερα εντάσσονται οι παρακάτω εργασίες :

1η Εργασία NT-1Π/1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 6067 τιμή μονάδος 14,10€/m³

2η Εργασία NT-1Π/2 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Τιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm τιμή μονάδος 72,00€/μ.μ.

3η Εργασία NT-1Π/3 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 τιμή μονάδος 89,80€/m³

4η Εργασία NT-1Π/4 Γεώφασμα διαχωρισμού Τιμή μονάδος 1,80€/m²

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 1^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο έργο λόγω της κακής ποιότητας υπόβασης της οδού απατήθηκε η εκσκαφή και αποκατάσταση με κατάλληλα υλικά σε μεγαλύτερο βάθος της οδού, επίσης η έντονη και συνεχής παρουσία υδάτων στα σημεία κατασκευής των στραγγιστηριών οδήγησε στην αντικατάσταση τους με σωληνωτούς οχετούς διατομής Φ60 και τεχνικών εισόδου και εξόδου, τέλος η παρουσία λιμναζόντων νερών καθ' όλη την διάρκεια τού χειμώνα σε 4 σημεία όπου θα κατασκευαστούν τεχνικά μας οδήγησε στην κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου και την τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού για την προστασία του επιχώματος του δρόμου.

Εξαιτίας των παραπάνω απρόβλεπτων περιστάσεων και επειδή πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γ) η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης (Ν.4412/2006, άρθ. 132, παρ. 1 (α), (β)), κρίνεται αιτιολογημένη η ανάγκη εκτέλεσης των παραπάνω συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με το Ν.4412/2006, άρθ. 132 & 156.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Σ.Σ. η τελική δαπάνη των εργασιών μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε. παρουσιάζει αύξηση 14,09% ως προς το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ήτοι δημιουργεί επιπλέον δαπάνη 62.193,34 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 77.119,74 € (με ΦΠΑ) το οποίο είναι μικρότερο του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης (Ν.4412/2006, άρθ. 132, παρ. 1 (α), (β)).

Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με την αριθ. 2/1^ο/15.10.2020 απόφαση του :

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ της έγκρισης της Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», για αυξομείωση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας έστειλε την αριθ. πρωτ. 14498/06.11.2020 εισηγητική έκθεση, που αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ»

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.300.000,00 € με Φ.Π.Α., με αριθμό 28/2018, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρσάλων και έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 205/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι.

Η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου έγινε μετά από ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την με αρ. 66/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων στην εργοληπτική επιχείρηση «'ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.'»,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 147, του Ν. 4412/2016, καθώς και τα παρακάτω:

α)το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 31/07/2019 με συμβατική προθεσμία 450 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα λήξη εργασιών την 22/10/2020.

β) την από 22/09/2020, με αριθ. Πρωτ. 11154, αίτηση του αναδόχου, με την οποία αιτείται συνολική παράταση των εργασιών έξι μηνών, ήτοι έως τις 23-04-2020, λόγω, α). αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης, β) καθυστέρησης έγκρισης εργασιών από τη αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας η οποία εκδόθηκε στις 14/04/2020, γ) αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών κατά το διάστημα από 20-03-20 έως και 20-05-2020 εξαιτίας του νέου κορωνοϊού 19.

Επίσης λόγω του γεγονότος ότι από την πλημμύρα στις (18-19)/ 09 - 2020, προέκυψαν έντονα προβλήματα και για την αντιμετώπιση τους απαιτείται χρόνος για την αποκατάστασή τους, προκειμένου να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες για τη ολοκλήρωση του έργου.

Προτείνεται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, ως τις 23/04/2021.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 :

α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. β) Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών στο οποία συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περίπτωση α της παραγράφου 1 «του παρόντος άρθρου – νόμος 4441/16, αρ. 22, παρ. 37» και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Ν4412/2016 :

Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των δύο ακόλουθων τιμών : α) των κατωτάτων ορίων του άρθρου 5 και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του αναφερόμενου έργου (σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας) και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:

- Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τον 1^ο ΑΠΕ & 1^η Σ.Σ.Ε. και την αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
- Την αριθ. 2/1ο/15.10.2020 απόφαση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, που εγκρίνει την 1^η ΣΣΕ τον 1ο ΑΠΕ
- Την αριθ. πρωτ. 11154/22.09.2020 αίτηση του αναδόχου για 1^η παράταση συμβατικής προθεσμίας
- Την αριθ. πρωτ. 14498/06.11.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει** για το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων»
- ✓ τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) δεδομένου ότι δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, συνολικής δαπάνης 556.688,00€ (448.941,93 + 107.746,06 ΦΠΑ) όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
 - ✓ την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (σύμφωνα με το άρθρο 132.1α,β, του Ν4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 156, του ίδιου νόμου) ποσού 77.119,74€ (62.193,34 + 14.926,40 ΦΠΑ). Για το ποσό των 77.119,74€ θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
2. Για την σύνταξη, υπογραφή και υλοποίηση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων» **απαιτείται** :
- ✓ Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, για την εγγραφή του ποσού της 1ης Σ.Σ.Ε.
 - ✓ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης της 1ης Σ.Σ.Ε.
3. **Εγκρίνει** την 1^η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα στη θέση “Βλαχόστρατα” του Δήμου Φαρσάλων», για έξι μήνων έως 23.04.2021 για τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση («ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε») στην αίτηση της και την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. **251/2020**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ.Σ.Υ.

Εσκιογλου Ιορδάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Χατζηπλή Σοφία
Γούσιος Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βαία
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης
Κατσιαούνης Ευάγγελος

Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 11 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος

Ιορδάνης Εσκιογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων
